REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: Obec Volárna
MĚSTO: Volárna
ULICE: směr od sil. 328

Počet úseků: 7
Celk. délka: 108.9 m
Počet Šachet: 8

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

zákazník: Obec Volárna **Celk. délka:** 108.70m
město: Volárna
ulice: směr od sil. 328
datum prohlídky: 24.02.2025
operátor: David Volenec

Č.:	Směr:	Od šachty:	Do šachty:	Rozm.:	Tvar:	Délka:	Č. úseku:
1	ve směru toku	Š na kraji parku	Š u č.p. 12	DN400	kruhový	3.03m	Š na kraji parku_Š u č.p. 1
2	ve směru toku	Š u č.p. 3	Š u č.p. 67	DN400	kruhový	25.08m	Š u č.p. 3_Š u č.p. 67
3	proti toku	Š u č.p. 6	Š u č.p. 67	DN400	kruhový	0.50m	Š u č.p. 67_Š u č.p. 6
4	ve směru toku	Š u č.p. 69	Š v parku	DN400	kruhový	27.22m	Š u č.p. 69_Š v parku
5	ve směru toku	Š u č.p. 6	směr náměstí	DN400	kruhový	0.50m	Š u č.p. 6_směr náměstí
6	proti toku	Š u č.p. 69	Š u č.p. 9	DN400	kruhový	31.40m	Š u č.p. 9_Š u č.p. 69
7	proti toku	Š na kraji parku	Š v parku	DN400	kruhový	21.13m	Š v parku_Š na kraji parku

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: levá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š na kraji parku_Š u č.p. 12
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: ve směru toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š na kraji parku
Do šachty: Š u č.p. 12

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š na kraji parku			
00:00:03	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:11		PA	0.50m	Začátek roury
00:00:32		RQ-U	0.50m	Příčná prasklina dole
00:01:17		A--O	3.03m	Odbočka vpředu
00:01:21	⊕	EH	3.03m	Konec úseku
	Š u č.p. 12			

Délka úseku: 3.03m

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

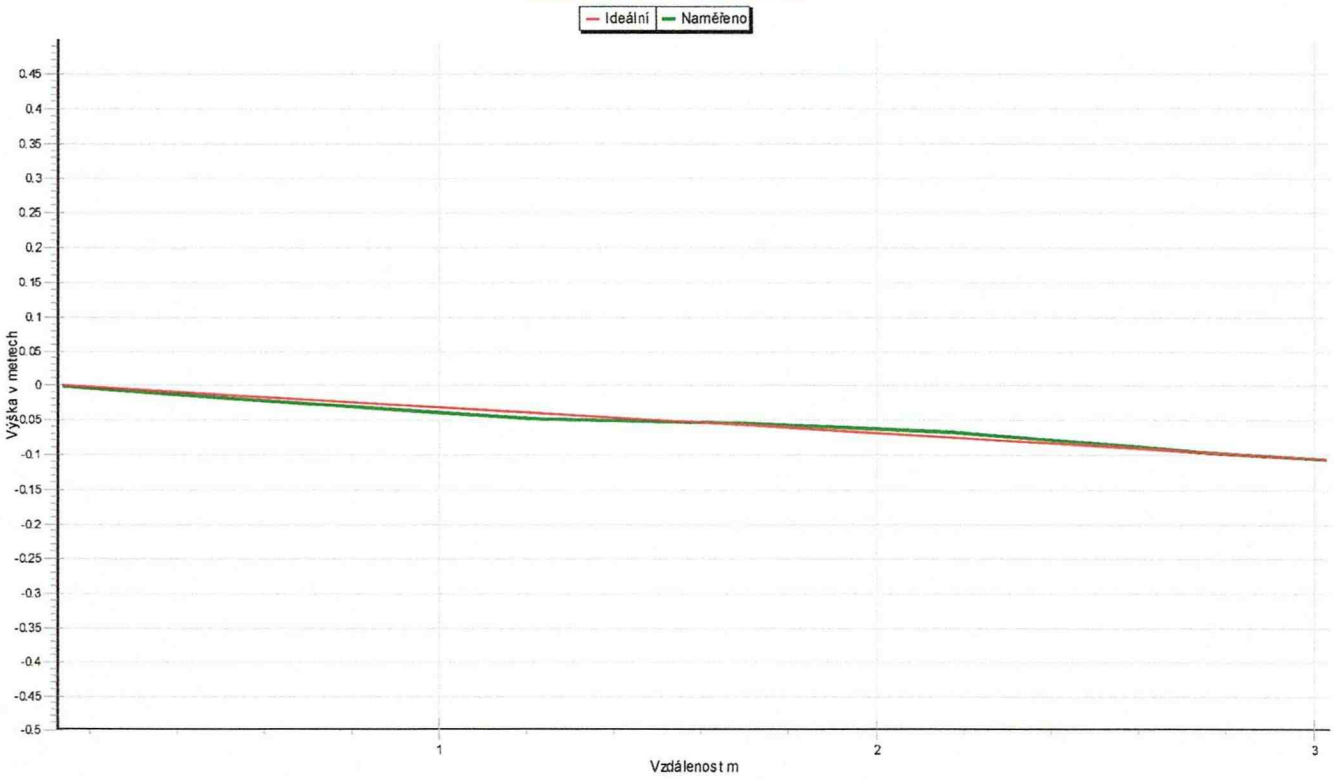

Od šachty: Š na kraji parku >> Do šachty: Š u č.p. 12 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: Volárna | ulice: směr od sil. 328 | č. úseku: Š na kraji parku_Š u č.p. 12 | datum prohlídky: 24.02.2025|
Celkové převýšení -10.56cm | Střední spád -3.49% |

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: pravá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š u č.p. 3_Š u č.p. 67
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: ve směru toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š u č.p. 3
Do šachty: Š u č.p. 67

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 3			
00:00:06	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:13		PA	0.50m	Začátek roury
00:01:16		RQ-O	14.26m	Příčná prasklina nahoře
00:01:43		RQ-O	17.15m	Příčná prasklina nahoře - vrůst kořenů
00:02:07		RQ-O	19.38m	Příčná prasklina nahoře
00:03:43		A--R	25.08m	Odbočka vpravo 2x
00:04:03		A--L	25.08m	Odbočka vlevo
00:04:17	⊕	EH	25.08m	Konec úseku
	Š u č.p. 67			

Délka úseku: 25.08m

IKAM fy ZIKMUND elektronic

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

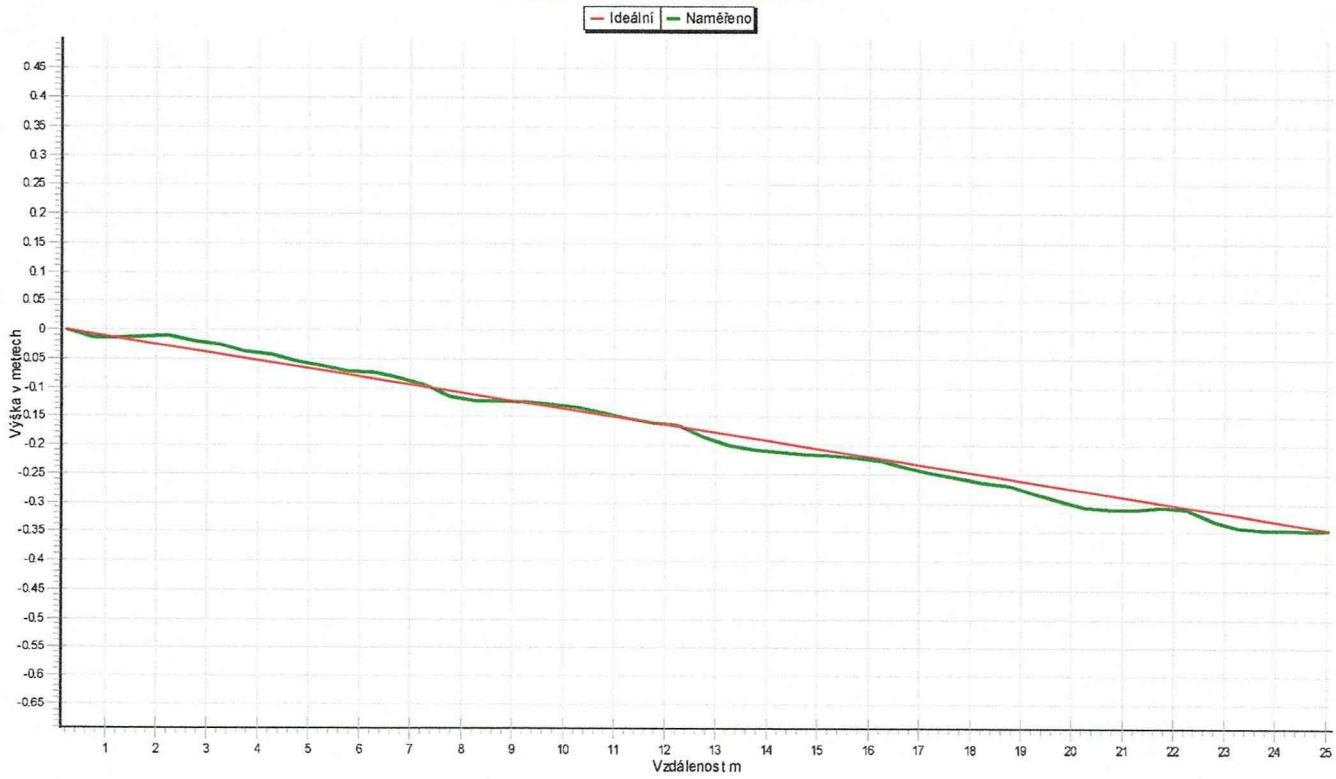

Od šachty: Š u č.p. 3 >> Do šachty: Š u č.p. 67 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: Volárna | ulice: směr od sil. 328 | č. úseku: Š u č.p. 3_Š u č.p. 67 | datum prohlídky: 24.02.2025|
Celkové převýšení -34.51cm | Střední spád -1.38% |

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: pravá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š u č.p. 67_Š u č.p. 6
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: proti toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š u č.p. 6
Do šachty: Š u č.p. 67

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 6			
00:00:07		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:17		BEM	0.00m	Kamera je zavešená
00:00:47		BEM	0.00m	Potrubí je zaneseno
00:01:02		IAB	0.00m	Přerušení inspekce

Délka úseku: 0.50m

IKAM fy ZIKMUND elektronic

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: levá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š u č.p. 69_Š v parku
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: ve směru toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š u č.p. 69
Do šachty: Š v parku

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 69			
00:00:10	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:18		PA	0.50m	Začátek roury
00:00:53		RQ-O	7.97m	Příčná prasklina nahoře
00:01:39		RQ-O	11.80m	Příčná prasklina nahoře, mírná deformace potrubí
00:02:00		BEM	12.73m	Popraskaná celá roura
00:02:20		A--L	15.33m	Odbočka vlevo
00:02:30		BEM	15.33m	Popraskaná celá roura
00:02:53		A--O	19.11m	Odbočka nahoře - neodborně zapravená
00:03:25		BEM	19.11m	Popraskaná celá roura
00:04:10		A--L	27.22m	Odbočka vlevo
00:04:34	⊕	EH	27.22m	Konec úseku
	Š v parku			

Délka úseku: 27.22m

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

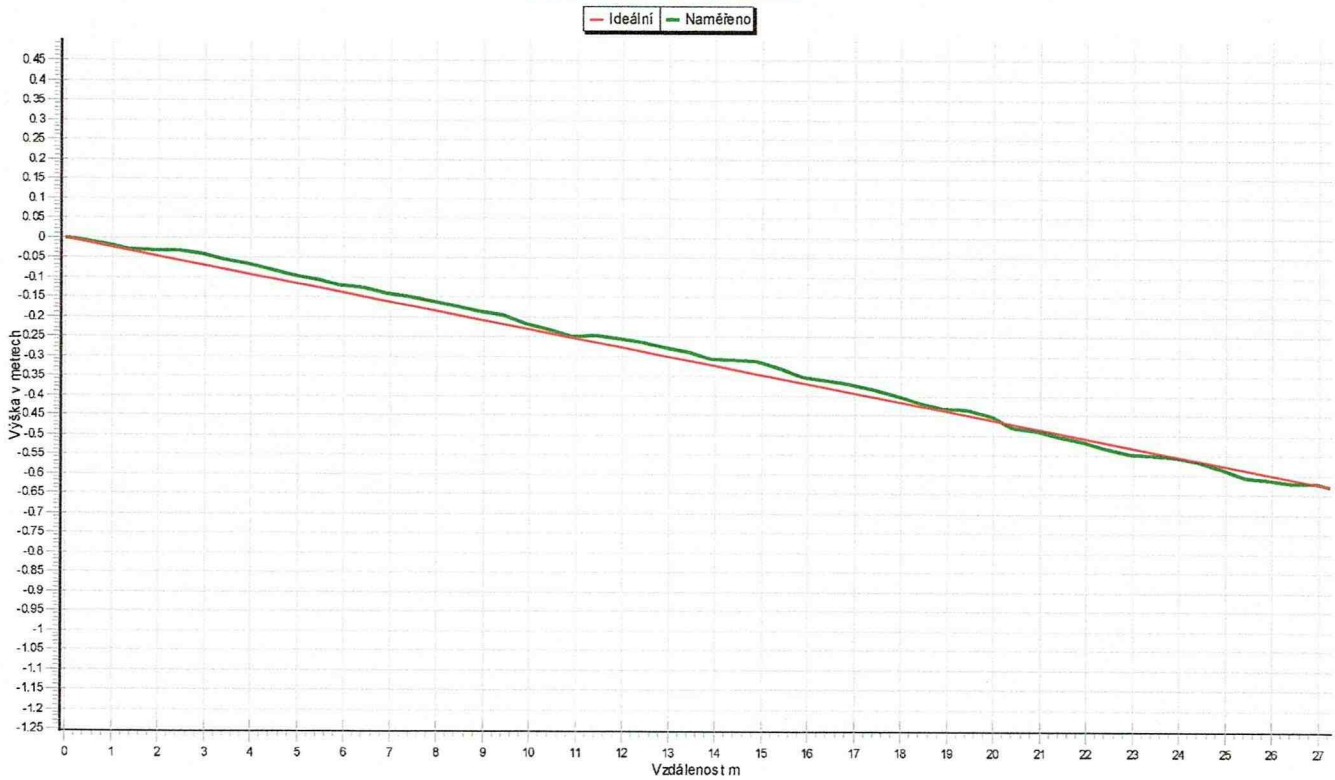

Od šachty: Š u č.p. 69 >> Do šachty: Š v parku | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: Volárna | ulice: směr od sil. 328 | č. úseku: Š u č.p. 69_Š v parku | datum prohlídky: 24.02.2025|
Celkové převýšení -62.98cm | Střední spád -2.31% |

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: pravá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š u č.p. 6_směr náměstí
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: ve směru toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š u č.p. 6
Do šachty: směr náměstí

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 6			
00:00:04		HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:11		BEM	0.00m	Kamera je zavěšená
00:00:20		BEM	0.00m	Potrubí je zaneseno
00:00:28		BEM	0.00m	Následující šachta nelze najít
00:00:35		IAB	0.00m	Přerušení inspekce

Délka úseku: 0.50m

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: levá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š u č.p. 9_Š u č.p. 69
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: proti toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š u č.p. 69
Do šachty: Š u č.p. 9

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š u č.p. 69			
00:00:05	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:12	—	PA	0.50m	Začátek roury
00:02:14	—	BEM	27.44m	Lom doprava
00:02:36	—	A--R	28.43m	Odbočka vpravo
00:03:20	⊕	EH	31.40m	Konec úseku
	Š u č.p. 9			

Délka úseku: 31.40m

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

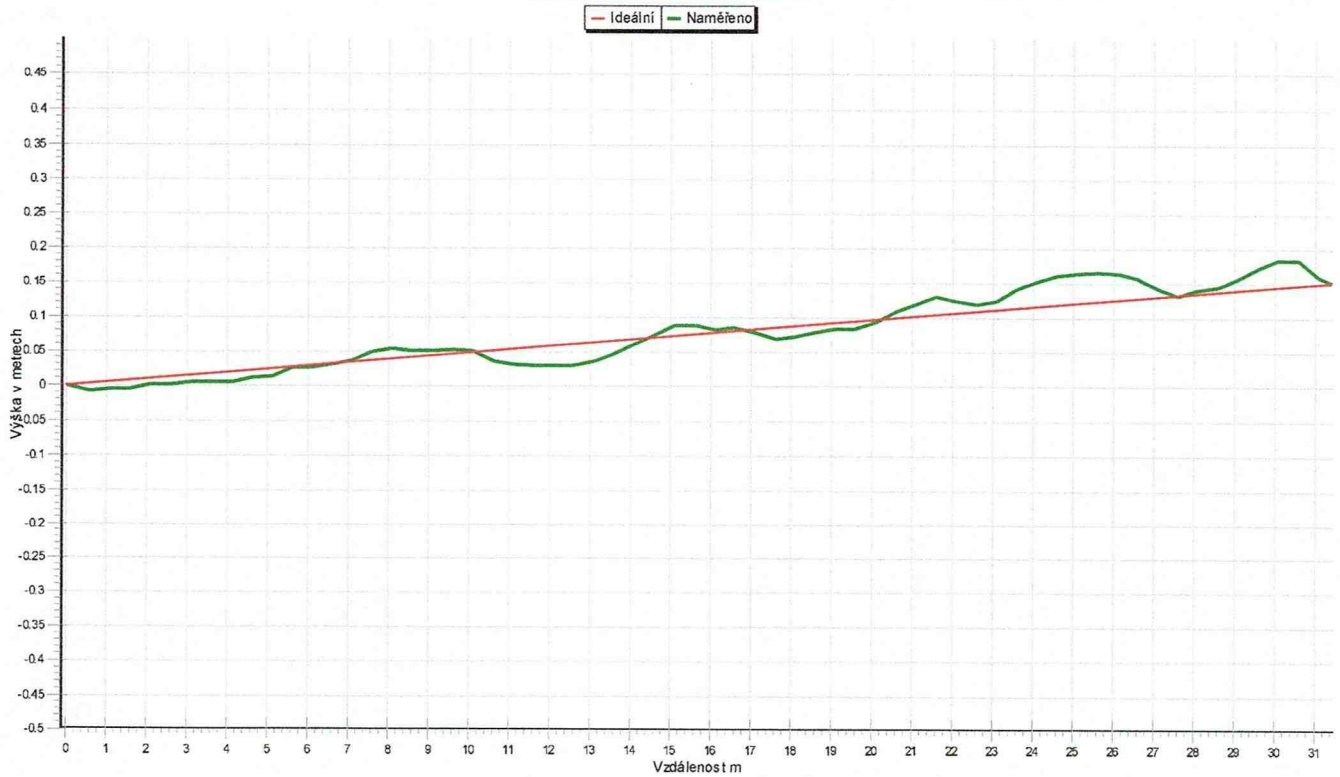

Od šachty: Š u č.p. 69 >> Do šachty: Š u č.p. 9 | Směr prohlídky: proti toku |
město: Volárna | ulice: směr od sil. 328 | č. úseku: Š u č.p. 9_Š u č.p. 69 | datum prohlídky: 24.02.2025|
Celkové převýšení 15.12cm | Střední spád 0.48% |

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizac
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafický protokol:

zákazník: Obec Volárna
ulice: směr od sil. 328
město: Volárna
akce: levá po toku
operátor: David Volenec
datum prohlídky: 24.02.2025
číslo kazety:
č. úseku: Š v parku_Š na kraji parku
č. stoky:
Poznámka:

druh prohlídky: Revize kanalizace
druh kanalizace: dešťová
Směr prohlídky: proti toku
materiál potrubí: Beton
tvar profilu: kruhový
rozměr potrubí: DN400
délka trubky:
Od šachty: Š na kraji parku
Do šachty: Š v parku

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	Š na kraji parku			
00:00:06	⊕	HA	0.00m	Začátek úseku
00:00:14		PA	0.50m	Začátek roury
00:00:28		RQ-L	0.50m	Příčná prasklina vlevo i vpravo
00:00:52		RQ-U	1.01m	Příčná prasklina dole, deformace potrubí
00:01:15		BEM	2.58m	Popraskaná celá roura
00:01:28		A--L	3.61m	Odbočka vlevo
00:02:36		BEM	17.76m	Popraskaná celá roura - deformace potrubí
00:02:48		A--R	18.27m	Odbočka vpravo
00:03:02		BEM	18.66m	Popraskaná celá roura - deformace potrubí
00:03:24	⊕	EH	21.13m	Konec úseku
	Š v parku			

Délka úseku: 21.13m

IKAM fy ZIKMUND elektronic :

Statické poškození, nutnost okamžité sanace
Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době
Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace
Statické poškození, střednědobá potřeba sana
V současné době není potřeba sana

REKOL Kanalsanierung, s.r.o. Polepská 724 Kolín IV
Monitoring, hydročištění a bezvýkopové sanace kanalizací
http://www.rekol.cz, e-mail: rekol@rekol.cz
mob.: 777 039 406, 602 141 610

Grafické znázornění spádu potrubí

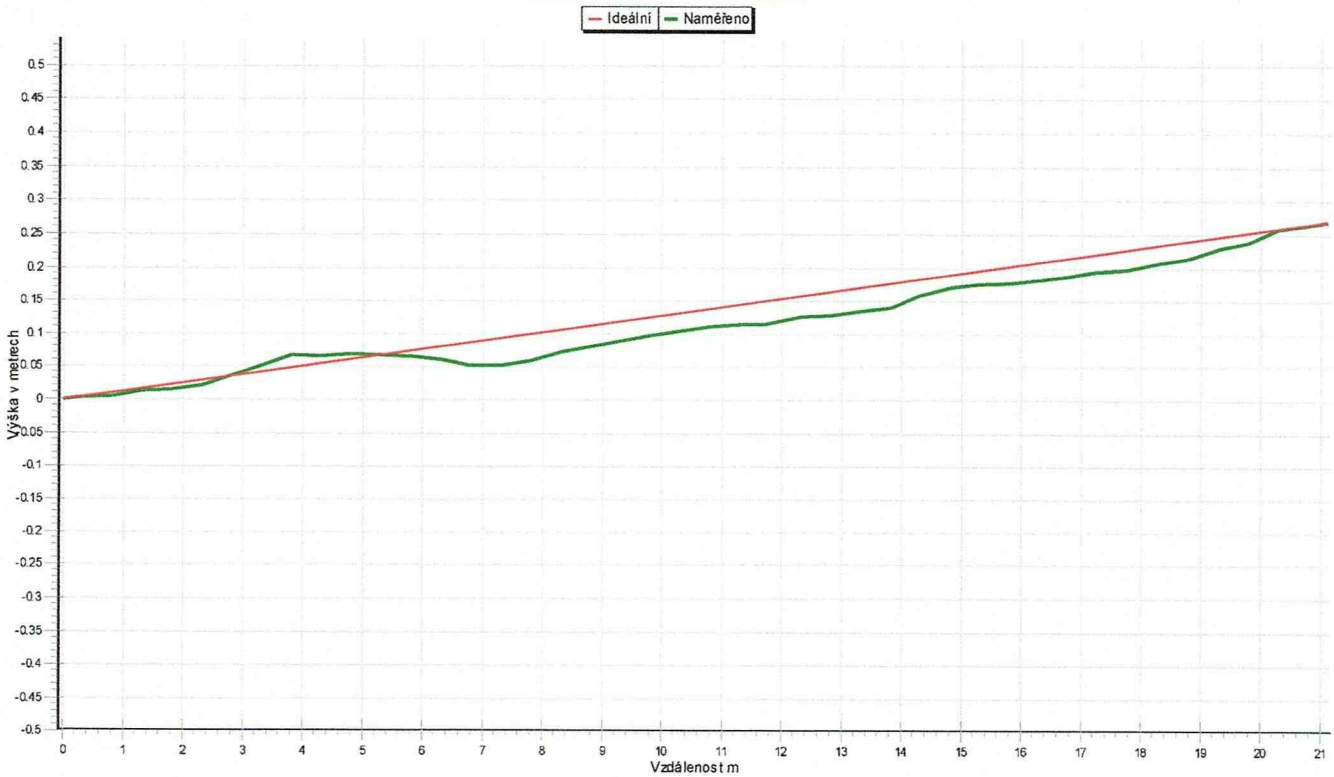

Od šachty: Š na kraji parku >> Do šachty: Š v parku | Směr prohlídky: proti toku |
město: Volárna | ulice: směr od sil. 328 | č. úseku: Š v parku_Š na kraji parku | datum prohlídky: 24.02.2025|
Celkové převýšení 26.95cm | Střední spád 1.28% |
